



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 599-407

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 599-407	Nr. 15
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 599	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 9,80
Lage Fahrbahn	Knoten unten 407	Insp. Länge [m] 9,80
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:73	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
407						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 407	00:00:00	599-407_6 4.jpg	
	0.90	A01 BBAA	Wurzeln - Pfahlwurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung, Anfang	00:00:16	599-407_6 5.jpg	
	2.20	B01 BBAA	Wurzeln - Pfahlwurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung, Ende	00:00:30	599-407_6 6.jpg	3
	6.00	BBAB	Wurzeln - einzelne, feine Wurzeln, 2% Querschnittsverminderung von 4 Uhr bis 7 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:50	599-407_6 7.jpg	2
	6.50	BABCB	Rissbildung - klaffender Riss am Rohrumfang, 20mm breit von 3 Uhr bis 9 Uhr	00:01:16	599-407_6 8.jpg	3
	9.80	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 599	00:01:59	599-407_6 9.jpg	
599						




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 599-407

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	599-407	15



599-407_64.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 407

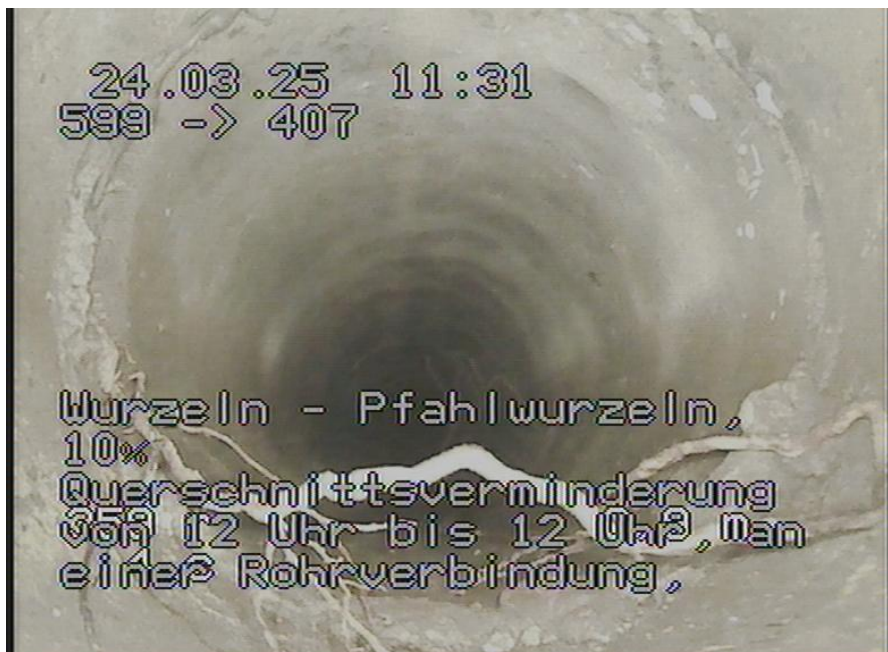


599-407_65.jpg, 00:00:16, 0.90m
Wurzeln - Pfahlwurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung, Anfang




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 599-407

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	599-407	15

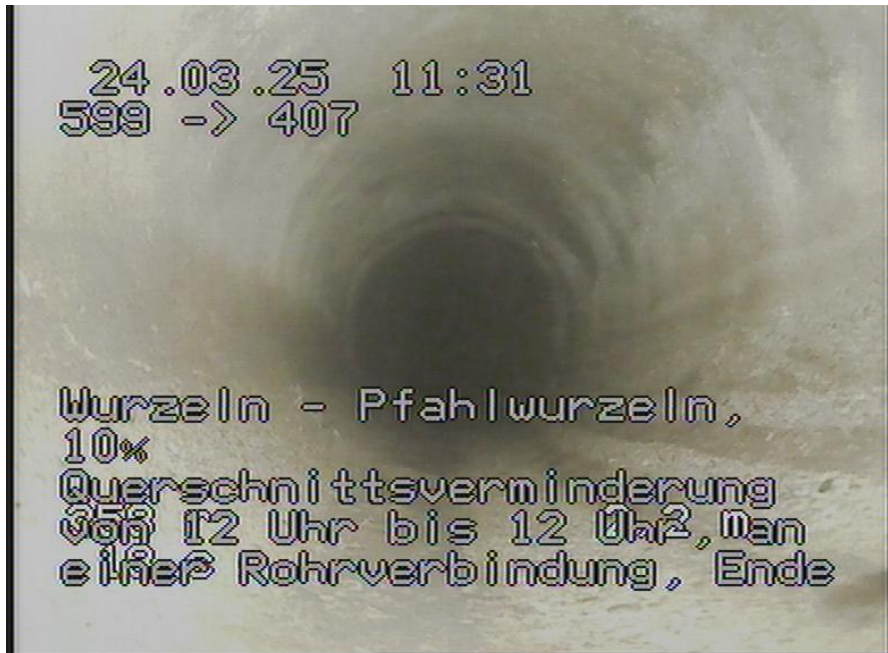

599-407_66.jpg, 00:00:30, 2.20m

Wurzeln - Pfahlwurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung, Ende

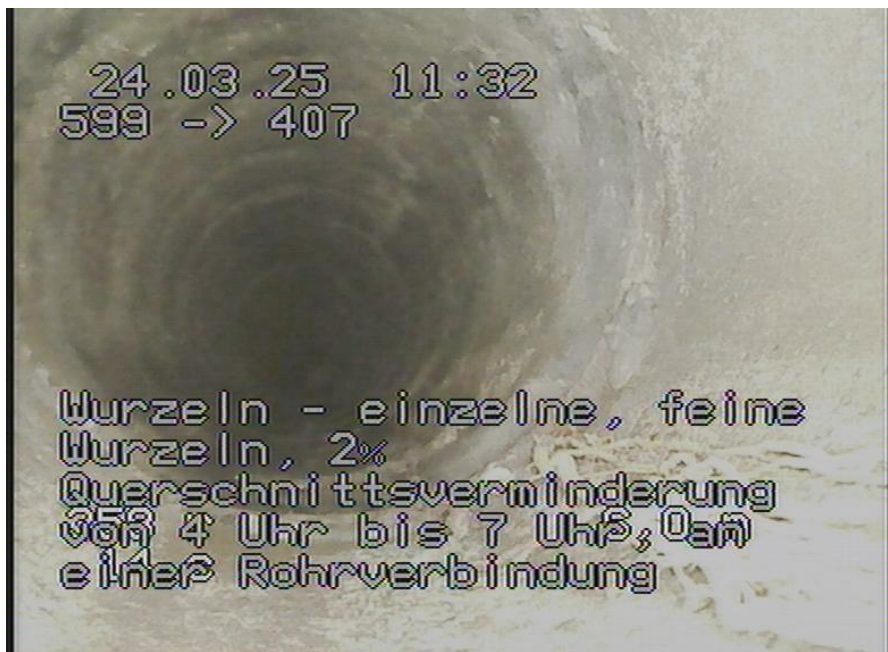

599-407_67.jpg, 00:00:50, 6.00m

Wurzeln - einzelne, feine Wurzeln, 2% Querschnittsverminderung von 4 Uhr bis 7 Uhr, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 599-407

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	599-407	15



599-407_68.jpg, 00:01:16, 6.50m
Rissbildung - klaffender Riss am Rohrumfang, 20mm breit von 3 Uhr bis 9 Uhr

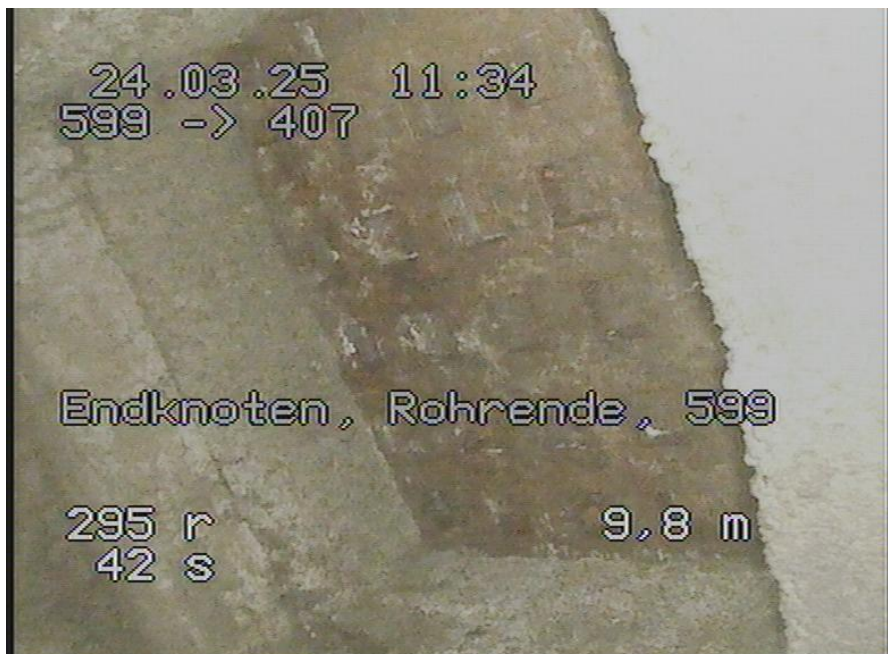

599-407_69.jpg, 00:01:59, 9.80m
Endknoten, Rohrende, 599
