




**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 24.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 345-346	Nr. 29
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermmedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	345	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	13,50
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	346	Insp. Länge [m]	13,50
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

	1:100	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	346						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 346	00:00:00	345-346_1 17.jpg		
	11.50	BAFZE	Anderer Oberflächenschaden, die Ursache ist nicht eindeutig feststellbar von 3 Uhr bis 9 Uhr / Leitung stark ausgespült	00:01:32	345-346_1 18.jpg	1	
	13.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 345	00:02:25	345-346_1 19.jpg		
	345						




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 345-346

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	345-346	29



345-346_117.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 346

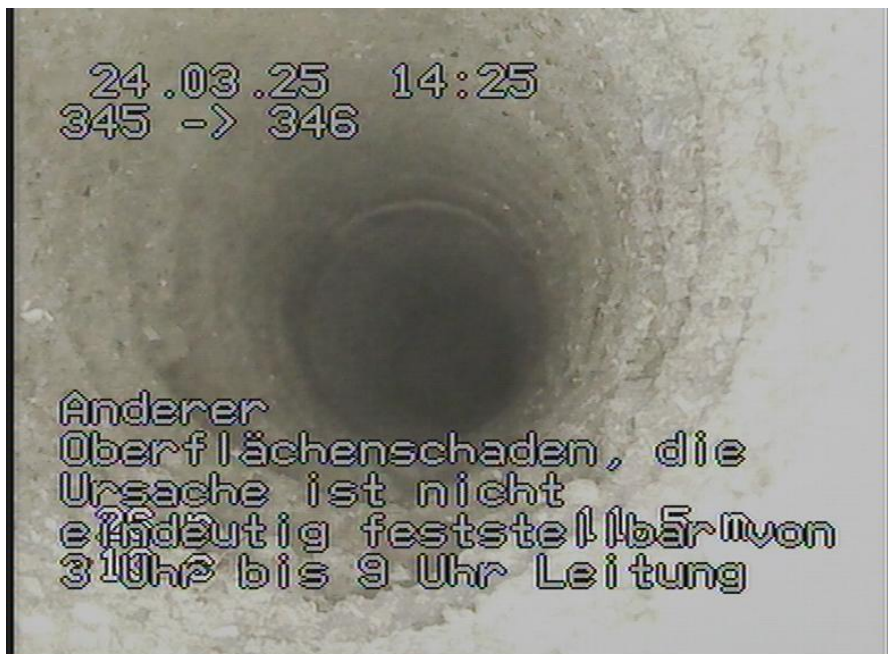

345-346_118.jpg, 00:01:32, 11.50m
Anderer Oberflächenschaden, die Ursache ist nicht eindeutig feststellbar von 3 Uhr bis 9 Uhr /
Leitung stark ausgespült



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 345-346

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	345-346	29



345-346_119.jpg, 00:02:25, 13.50m
Endknoten, Rohrende, 345
