

**Haltungsinspektion - 28.04.2025 - 377-378**

Datum 28.04.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 377-378	Nr. 107
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	377	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	49,09
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	378	Insp. Länge [m]	2,06
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:361	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 377	00:00:00	377-378_396.jpg	
	2.06	BDCYC	Gegenseite erreicht	00:00:33	377-378_397.jpg	
	49.09		Rohrende			



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 28.04.2025 - 377-378

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	28.04.2025	377-378	107



377-378_396.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 377



377-378_397.jpg, 00:00:33, 2.06m
Gegenseite erreicht



**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 27.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 377-378	Nr. 107
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	377	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	49,09
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	378	Insp. Länge [m]	49,09
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	
Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera		
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung		
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung		
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja		
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.			

1:361	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 378	00:00:00	377-378_3 67.jpg	
	48.92	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung	00:03:49	377-378_3 68.jpg	
	49.09	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:04:44	377-378_3 69.jpg	
	49.09	BDCYY	Abbruch der Inspektion / Querschnittsreduzierung	00:04:48	377-378_3 70.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 377-378

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	377-378	107



377-378_367.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 378

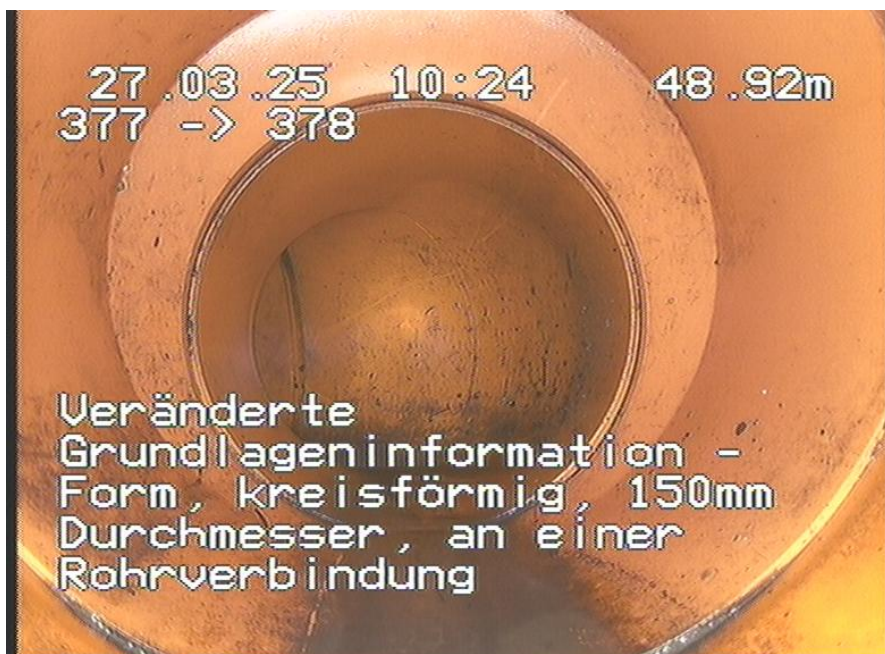


377-378_368.jpg, 00:03:49, 48.92m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 27.03.2025 - 377-378

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	377-378	107

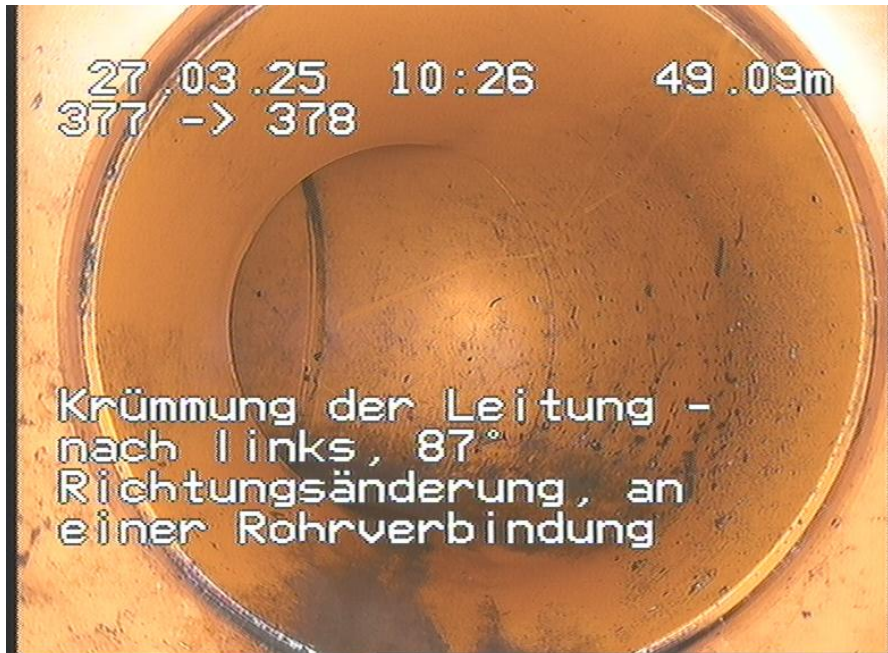

377-378_369.jpg, 00:04:44, 49.09m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



377-378_370.jpg, 00:04:48, 49.09m
Abbruch der Inspektion / Querschnittsreduzierung
