



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 467-290

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 467-290	Nr. 65
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 467	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 34,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 290	Insp. Länge [m] 34,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 500mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:250	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
						
467	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 467	00:00:00	467-290_2 27.jpg	
	16.19	BAG	Anschluss -, 20% einragend bei 11 Uhr	00:01:15	467-290_2 28.jpg	2
	16.19	BCAEA	Anschluss - einfach, gemeisselt, offen, 150mm hoch bei 11 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:01:15	467-290_2 29.jpg	
	21.57	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:15	467-290_2 30.jpg	
	22.19	BAP	Hohlraum sichtbar - Hohlraum ausserhalb der Rohrleitung durch Schadstelle sichtbar bei 12 Uhr	00:01:15	467-290_2 31.jpg	5
	28.33	A01 BABBA	Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 1 Uhr, an einer Rohrverbindung, Anfang	00:01:15	467-290_2 32.jpg	
	29.93	B01 BABBA	Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 1 Uhr, an einer Rohrverbindung, Ende	00:01:15	467-290_2 33.jpg	2
	30.84	BACA	Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 250mm von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:01:15	467-290_2 34.jpg	3
	34.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 290	00:01:15	467-290_2 35.jpg	
290						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 467-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	467-290	65



467-290_227.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 467




467-290_228.jpg, 00:01:15, 16.19m
Anschluss -, 20% einragend bei 11 Uhr




Haltungsbilder - 25.03.2025 - 467-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	467-290	65

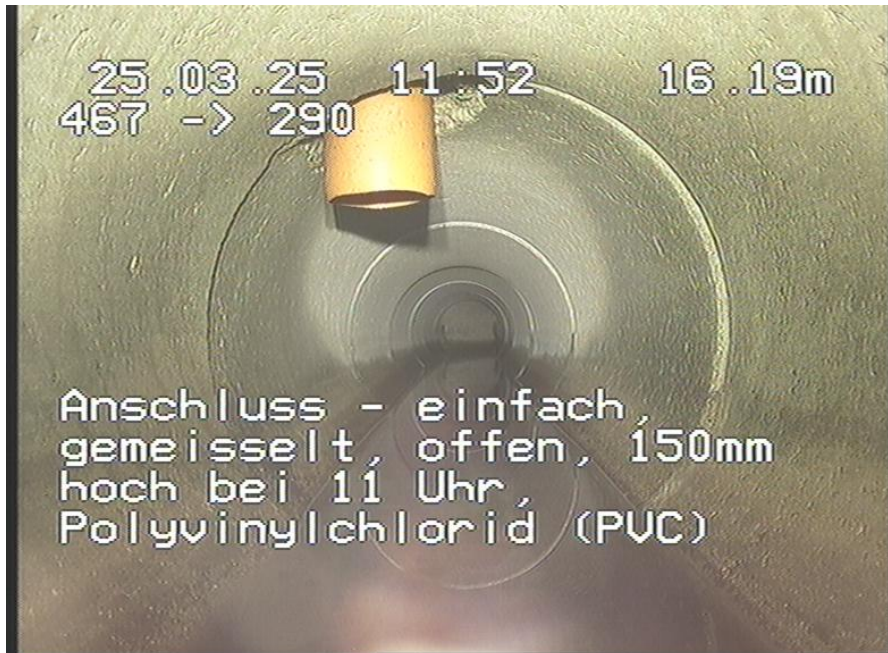

467-290_229.jpg, 00:01:15, 16.19m
Anschluss - einfach, gemeisselt, offen, 150mm hoch bei 11 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)

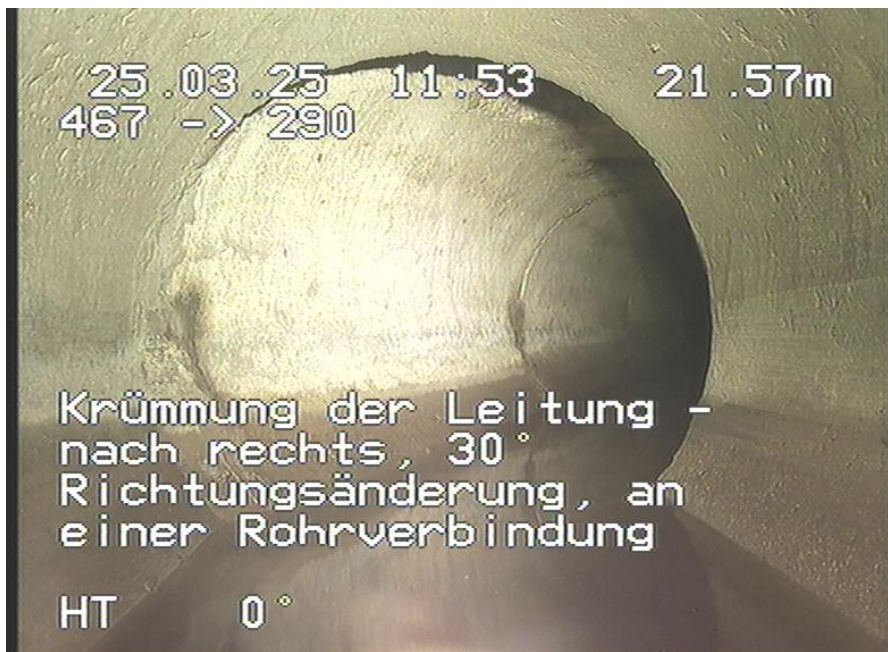

467-290_230.jpg, 00:01:15, 21.57m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 25.03.2025 - 467-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	467-290	65



467-290_231.jpg, 00:01:15, 22.19m
Hohlraum sichtbar - Hohlraum ausserhalb der Rohrleitung durch Schadstelle sichtbar bei 12 Uhr



467-290_232.jpg, 00:01:15, 28.33m
Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 1 Uhr, an einer Rohrverbindung, Anfang



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 467-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	467-290	65



467-290_233.jpg, 00:01:15, 29.93m

Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 1 Uhr, an einer Rohrverbindung, Ende



467-290_234.jpg, 00:01:15, 30.84m

Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 250mm von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 467-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	467-290	65



467-290_235.jpg, 00:01:15, 34.00m
Endknoten, Rohrende, 290
