

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 485-486

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 485-486	Nr. 87
Projektname Fundermax St. Veit	Video-SpeichermEDIUM sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	485	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	16,70
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	486	Insp. Länge [m]	16,70
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:123	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 486	00:00:00	485-486_303.jpg	
	15.90	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:00	485-486_304.jpg	
	16.70	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 485	00:01:12	485-486_305.jpg	




Haltungsbilder - 26.03.2025 - 485-486

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	485-486	87



485-486_303.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 486

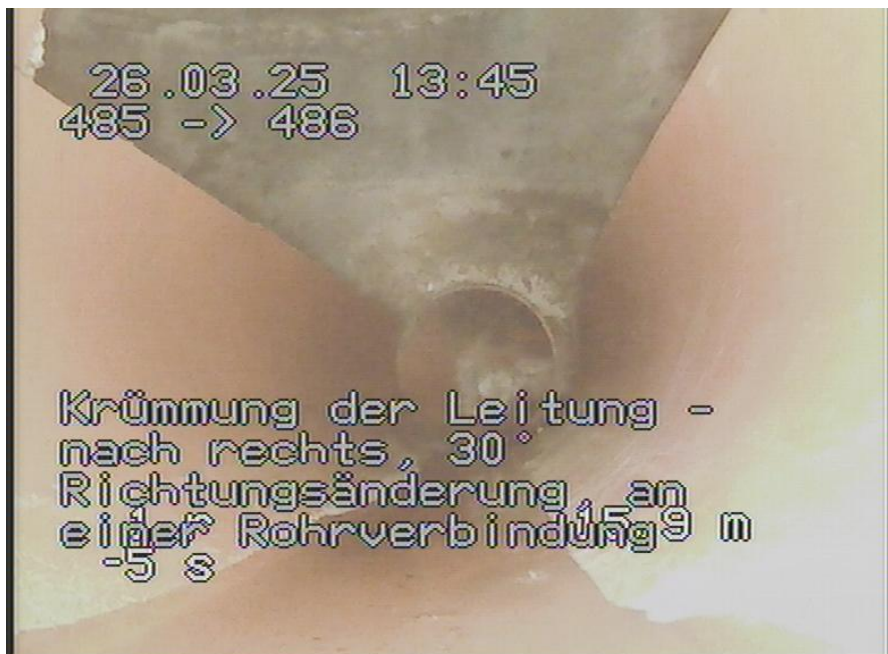

485-486_304.jpg, 00:01:00, 15.90m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 485-486

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	485-486	87

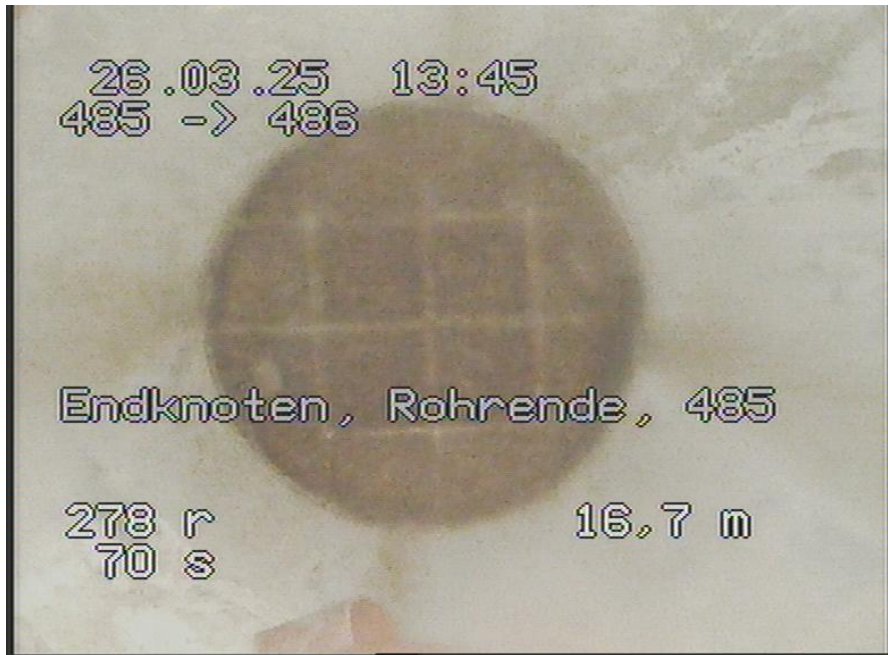

485-486_305.jpg, 00:01:12, 16.70m
Endknoten, Rohrende, 485
