



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 531-705

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 531-705	Nr. 198
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 531	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 17,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 705	Insp. Länge [m] 17,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:125	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
705						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 705	00:00:00	531-705_7 22.jpg	
	10.00	BACB	Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 50mm von 12 Uhr bis 3 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:57	531-705_7 23.jpg	3
	12.10	BACB	Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 80mm von 12 Uhr bis 6 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:01:15	531-705_7 24.jpg	3
	16.00	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:57	531-705_7 25.jpg	
	16.60	BCAEA	Anschluss - einfach, gemeisselt, offen, 150mm hoch bei 3 Uhr, Beton (B)	00:02:28	531-705_7 26.jpg	
	16.60	BACA	Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 500mm von 8 Uhr bis 4 Uhr	00:02:32	531-705_7 27.jpg	3
	17.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 531	00:02:50	531-705_7 28.jpg	
531						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 531-705

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	531-705	198



531-705_722.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 705

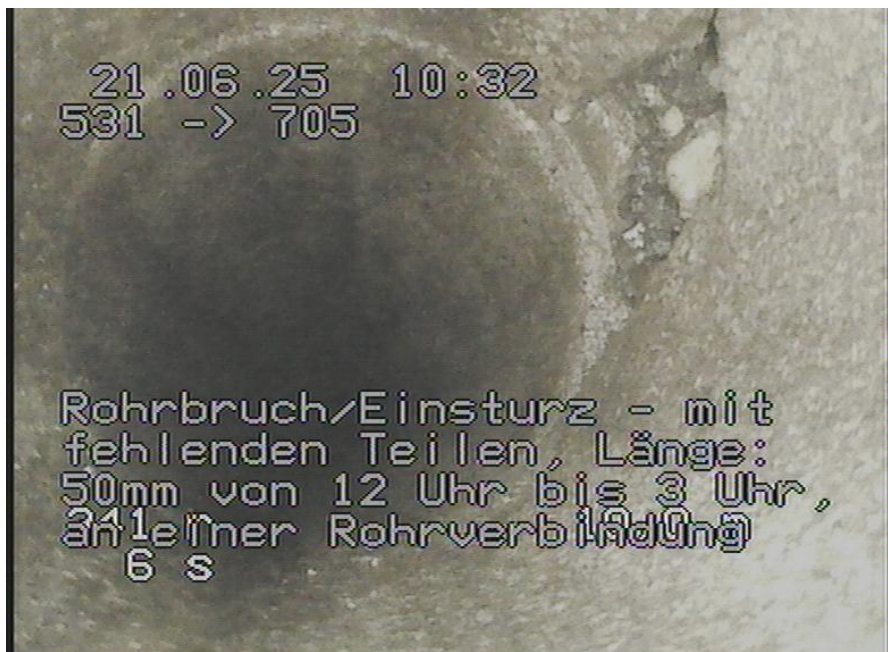


531-705_723.jpg, 00:00:57, 10.00m
Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 50mm von 12 Uhr bis 3 Uhr, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 21.06.2025 - 531-705

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	531-705	198

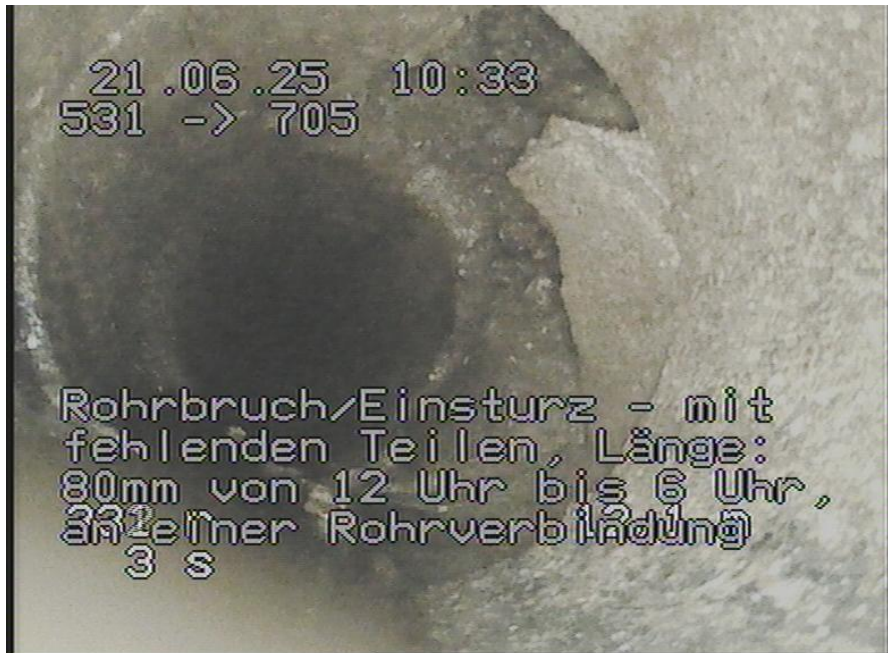

531-705_724.jpg, 00:01:15, 12.10m

Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 80mm von 12 Uhr bis 6 Uhr, an einer Rohrverbindung

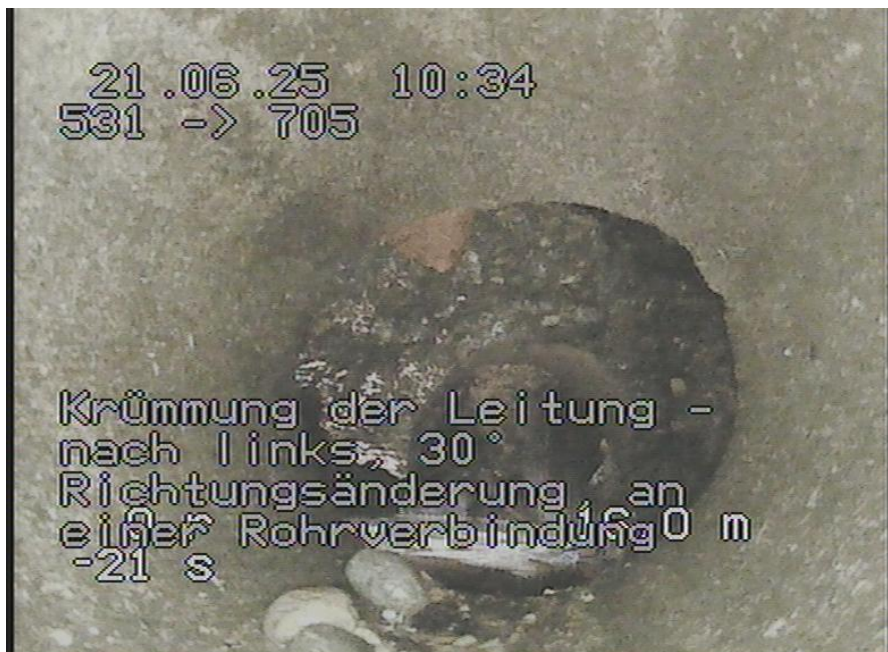

531-705_725.jpg, 00:01:57, 16.00m

Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 531-705

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	531-705	198

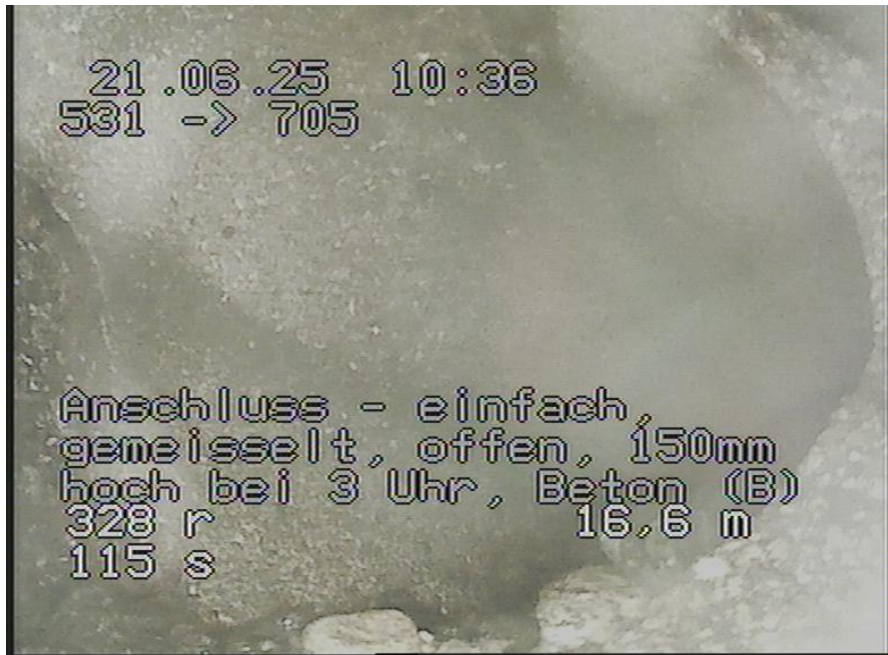

531-705_726.jpg, 00:02:28, 16.60m
Anschluss - einfach, gemeisselt, offen, 150mm hoch bei 3 Uhr, Beton (B)

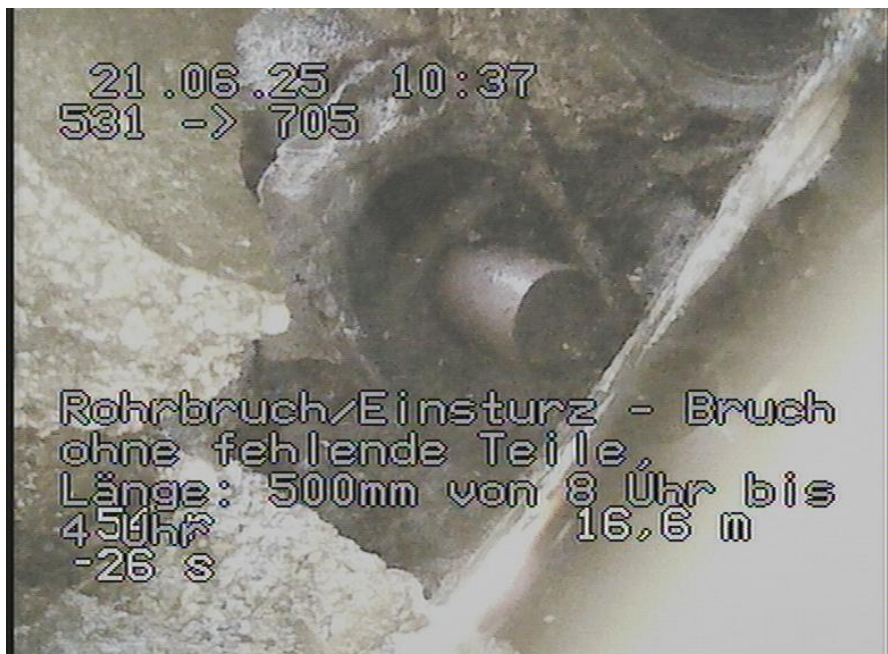

531-705_727.jpg, 00:02:32, 16.60m
Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 500mm von 8 Uhr bis 4 Uhr



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 531-705

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	531-705	198



531-705_728.jpg, 00:02:50, 17.00m
Endknoten, Rohrende, 531
