



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 20.06.2025 - 535-537

Datum 20.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 535-537	Nr. 184
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 535	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 2,40
Lage Fahrbahn	Knoten unten 537	Insp. Länge [m] 2,40
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 537	00:00:00	535-537_6 73.jpg	
	0.90	BAJA	Verschobene Verbindung -, Abstand: 40mm in Längsrichtung, an einer Rohrverbindung (Verschiebung parallel zur Rohrachse) von 9 Uhr bis 3 Uhr	00:00:20	535-537_6 74.jpg	3
	2.40	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 535	00:00:40	535-537_6 76.jpg	




Haltungsbilder - 20.06.2025 - 535-537

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	20.06.2025	535-537	184



535-537_673.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 537

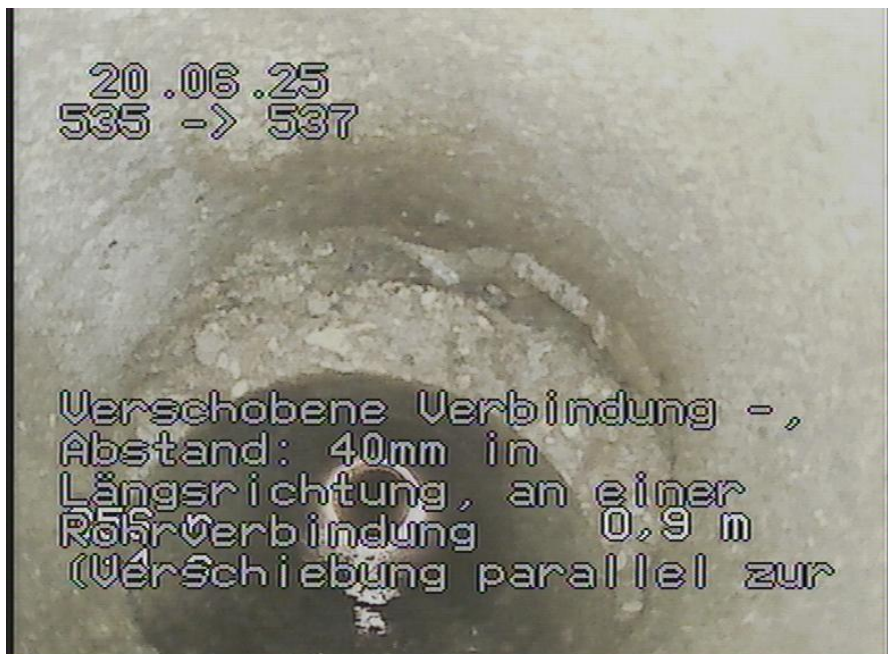

535-537_674.jpg, 00:00:20, 0.90m
Verschobene Verbindung -, Abstand: 40mm in Längsrichtung, an einer Rohrverbindung
(Verschiebung parallel zur Rohrachse) von 9 Uhr bis 3 Uhr



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 20.06.2025 - 535-537

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	20.06.2025	535-537	184



535-537_676.jpg, 00:00:40, 2.40m
Endknoten, Rohrende, 535
