



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 592-323

Datum 24.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 592-323	Nr. 5
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 592	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 2,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 323	Insp. Länge [m] 2,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 100mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
323						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 323	00:00:00	592-323_1 8.jpg	
	2.40	BACB	Rorhbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 50mm von 11 Uhr bis 1 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:40	592-323_1 9.jpg	3
	2.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 592	00:00:54	592-323_2 0.jpg	
592						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 592-323

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	592-323	5



592-323_18.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 323

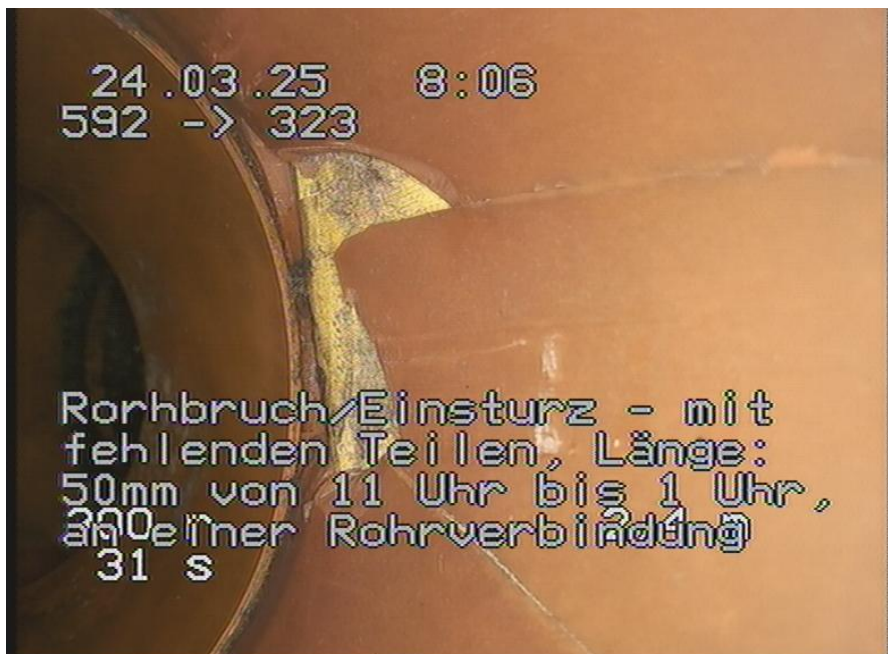

592-323_19.jpg, 00:00:40, 2.40m
Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 50mm von 11 Uhr bis 1 Uhr, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 592-323

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	592-323	5



592-323_20.jpg, 00:00:54, 2.50m
Endknoten, Rohrende, 592
