



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 619-467

Datum 25.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 619-467	Nr. 69
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 619	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 16,20
Lage Fahrbahn	Knoten unten 467	Insp. Länge [m] 16,20
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:120	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
467						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 467	00:00:00	619-467_2 42.jpg	
	0.80	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:17	619-467_2 43.jpg	
	9.00	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 3 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:01:02	619-467_2 44.jpg	
	16.20	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 619	00:01:36	619-467_2 45.jpg	
619						




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 619-467

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	619-467	69

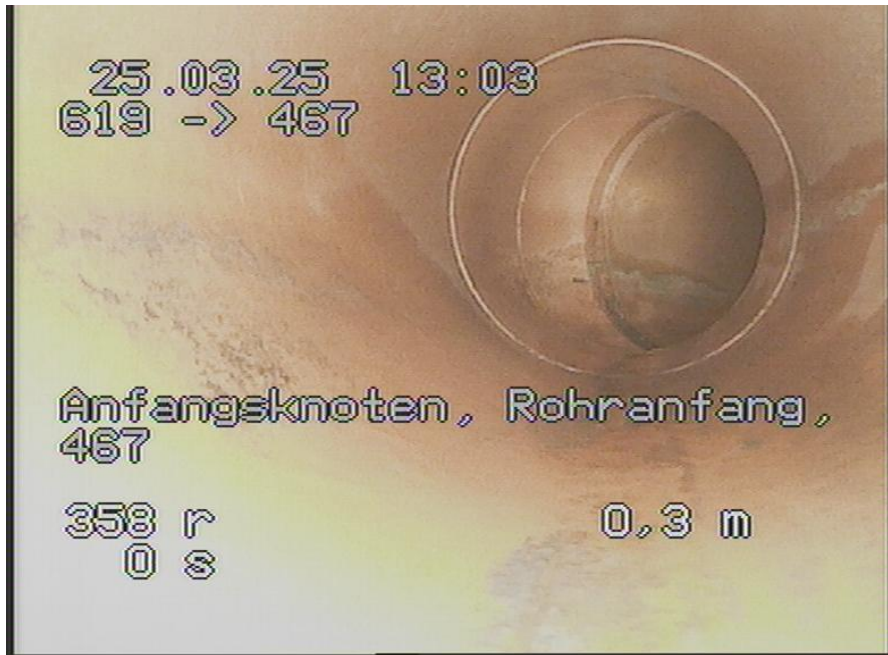

619-467_242.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 467

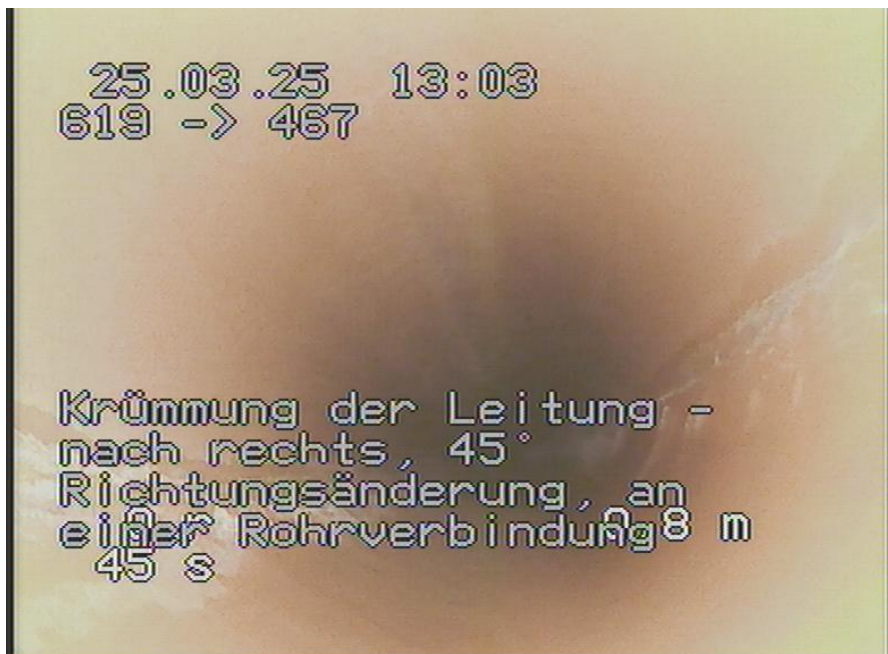


619-467_243.jpg, 00:00:17, 0.80m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 25.03.2025 - 619-467

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	619-467	69

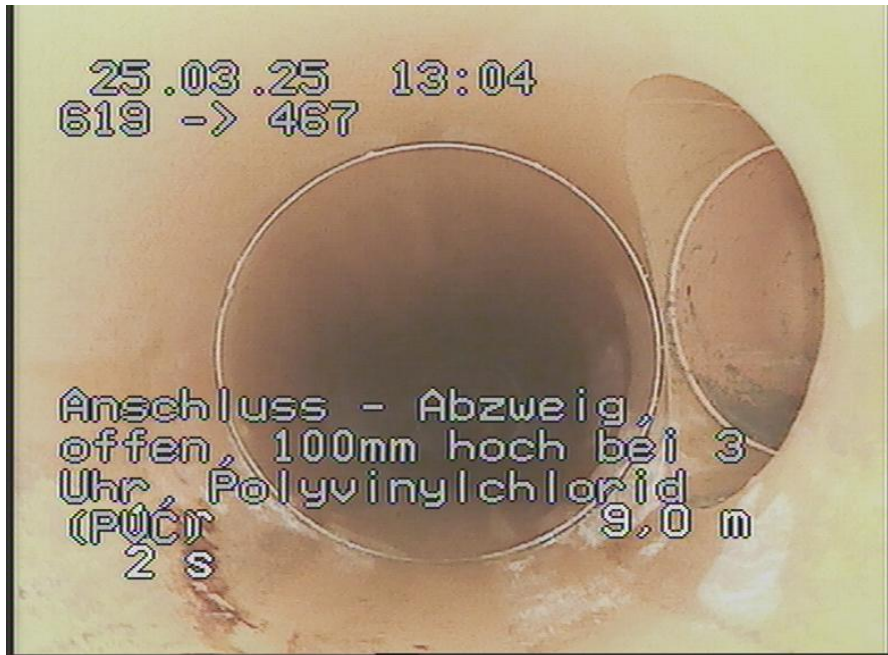

619-467_244.jpg, 00:01:02, 9.00m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 3 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)

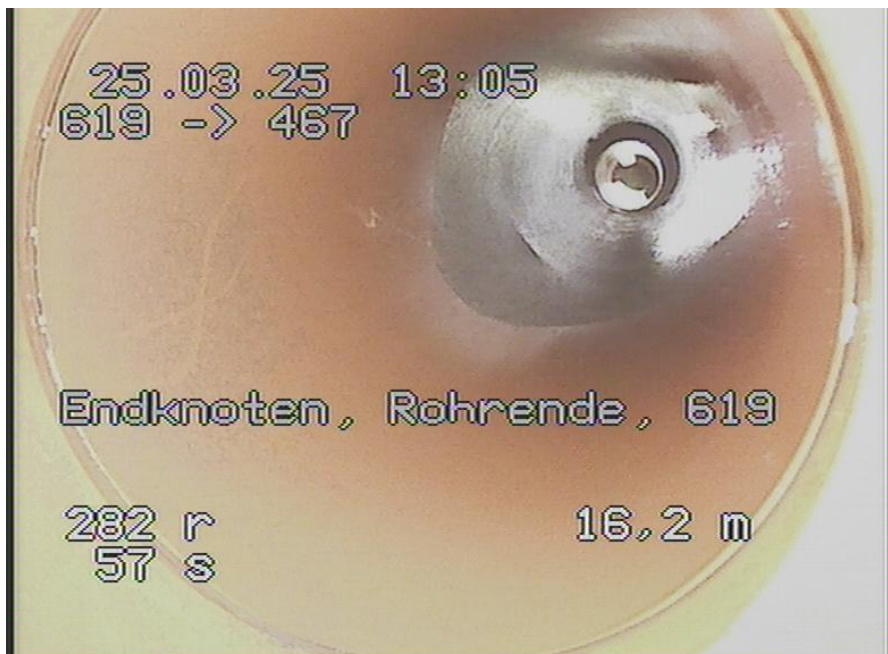

619-467_245.jpg, 00:01:36, 16.20m
Endknoten, Rohrende, 619
