



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 625-285

Datum 26.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 625-285	Nr. 77
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 625	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 8,10
Lage Fahrbahn	Knoten unten 285	Insp. Länge [m] 8,10
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:60	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 285	00:00:00	625-285_2 65.jpg	
	4.40	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 3 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:00:32	625-285_2 66.jpg	
	4.60	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung	00:00:44	625-285_2 67.jpg	
	5.70	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:02	625-285_2 68.jpg	
	7.60	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:22	625-285_2 69.jpg	
	8.10	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 625	00:01:43	625-285_2 70.jpg	




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 625-285

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	625-285	77

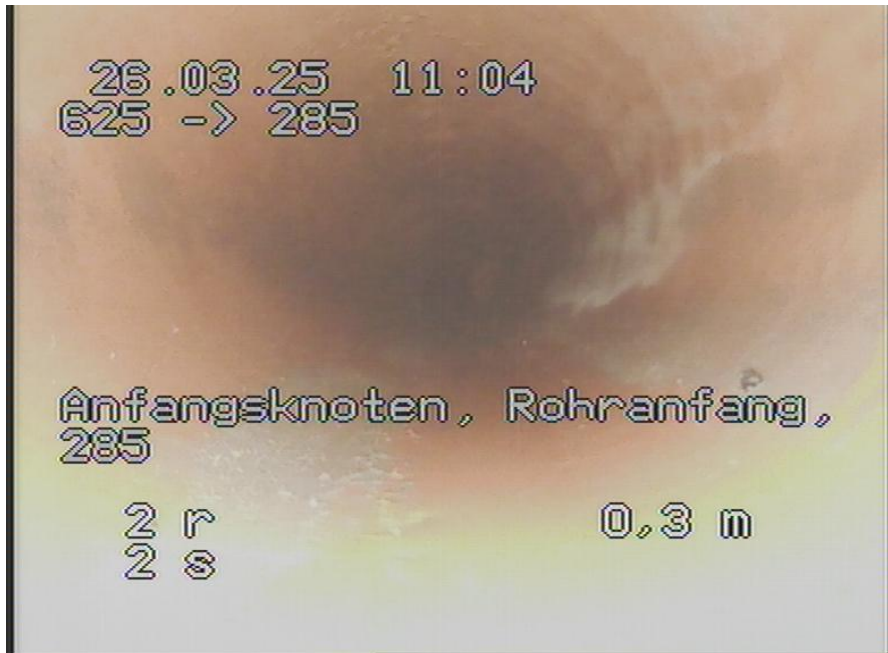

625-285_265.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 285

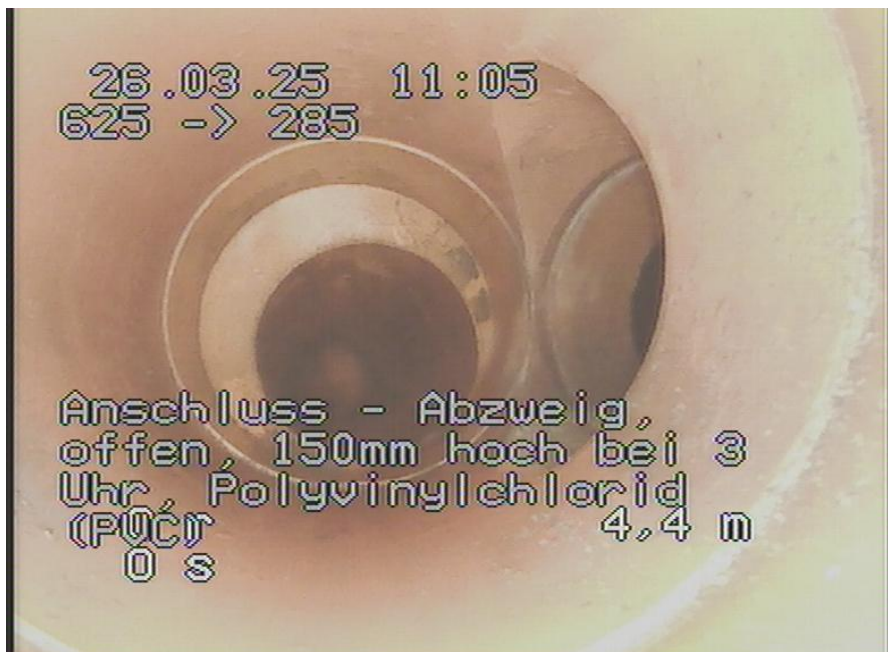


625-285_266.jpg, 00:00:32, 4.40m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 3 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



Haltungsbilder - 26.03.2025 - 625-285

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	625-285	77

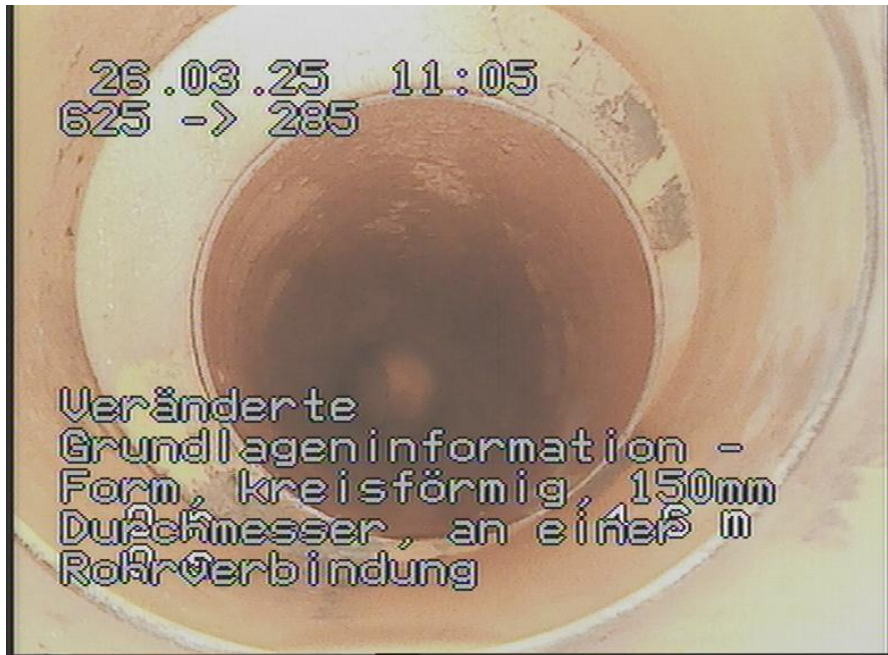

625-285_267.jpg, 00:00:44, 4.60m

Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung




625-285_268.jpg, 00:01:02, 5.70m

Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 26.03.2025 - 625-285

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	625-285	77

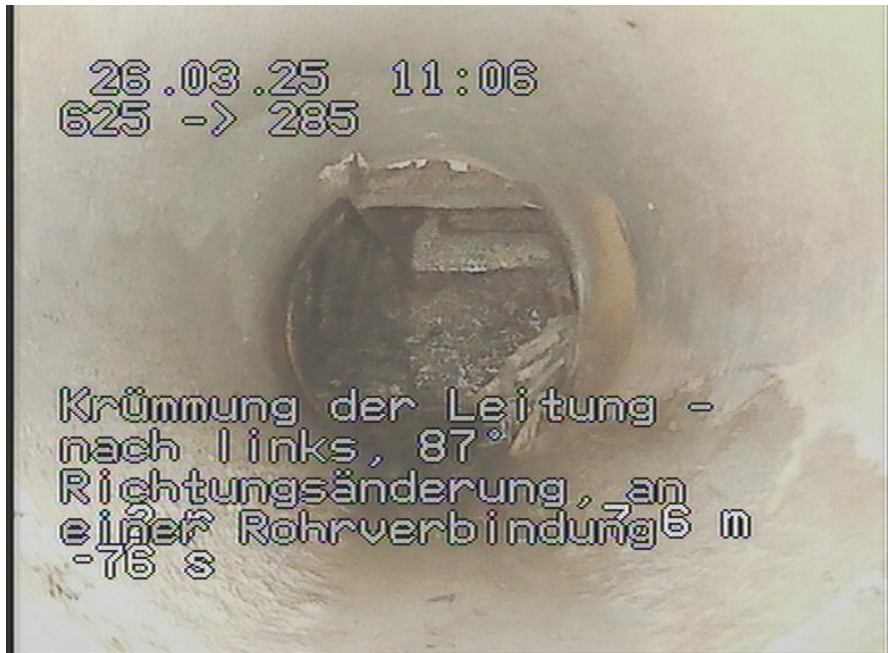

625-285_269.jpg, 00:01:22, 7.60m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



625-285_270.jpg, 00:01:43, 8.10m
Endknoten, Rohrende, 625
