



Haltungsinspektion - 30.04.2025 - 630-491

Datum 30.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 630-491	Nr. 148
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	630	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	26,60
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	491	Insp. Länge [m]	26,60
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:196	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
630						
0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 630	00:00:00	630-491_5 06.jpg		
22.40	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:55	630-491_5 07.jpg		
22.50	BAAA	Verformung - des Rohrquerschnitts, vertikal, 30% Reduzierung der Abmessung von 9 Uhr bis 3 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:01:58	630-491_5 08.jpg	5	
22.50	BAIAB	Einragendes Dichtungsmat. - Dichtring einragend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb der Rohrmitte von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:02:01	630-491_5 09.jpg	2	
26.60	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 491	00:02:47	630-491_5 10.jpg		
491						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 630-491

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	630-491	148



630-491_506.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 630

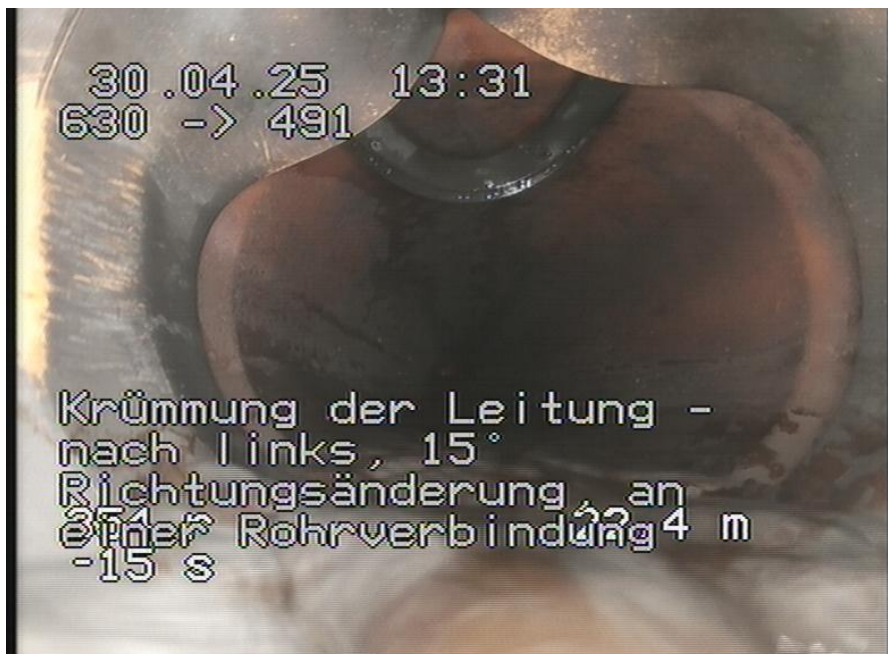


630-491_507.jpg, 00:01:55, 22.40m
Krümmung der Leitung - nach links, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 30.04.2025 - 630-491

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	630-491	148

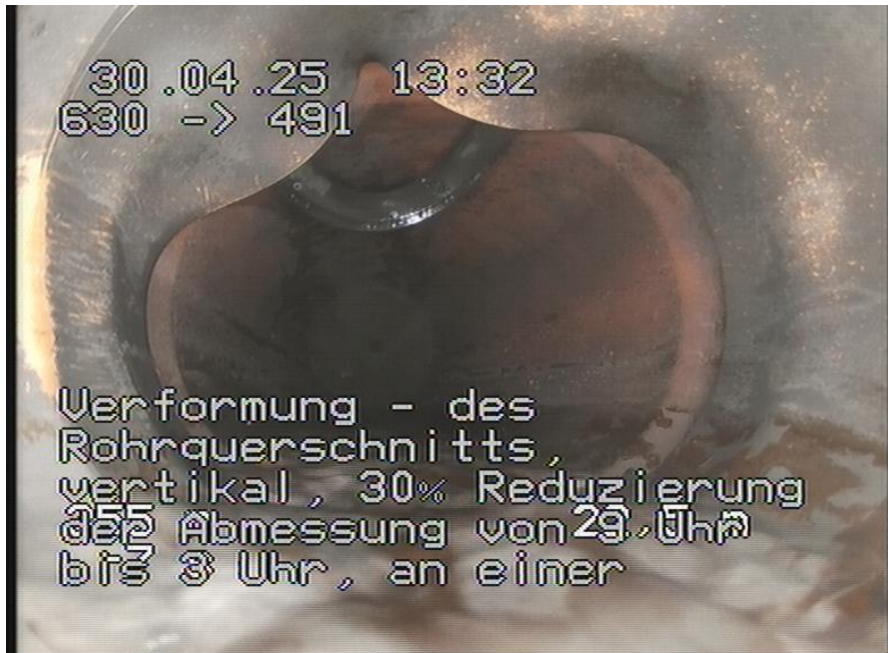

630-491_508.jpg, 00:01:58, 22.50m

Verformung - des Rohrquerschnitts, vertikal, 30% Reduzierung der Abmessung von 9 Uhr bis 3 Uhr, an einer Rohrverbindung

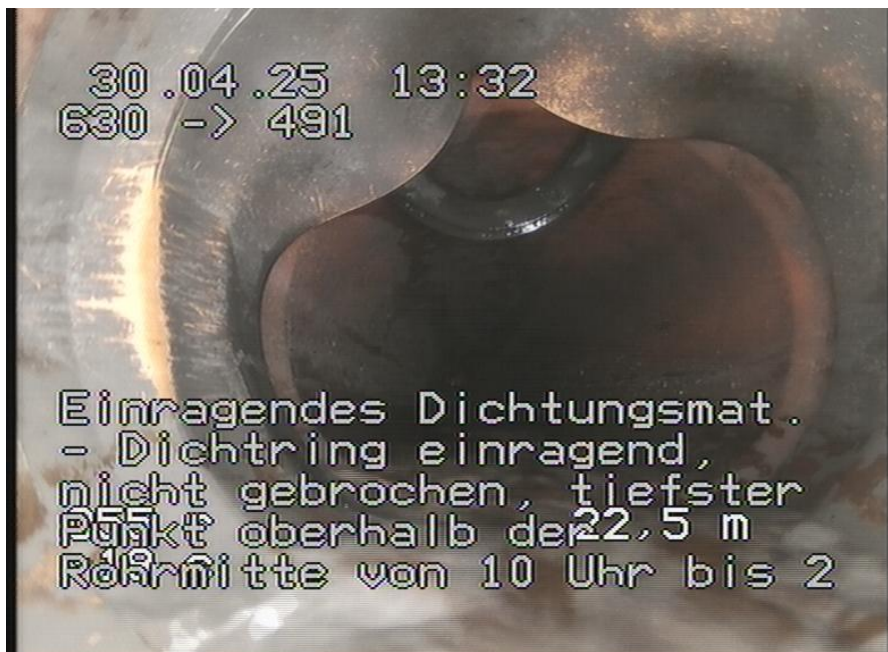

630-491_509.jpg, 00:02:01, 22.50m

Einragendes Dichtungsmat. - Dichtring einragend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb der Rohrmitte von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 630-491

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	630-491	148

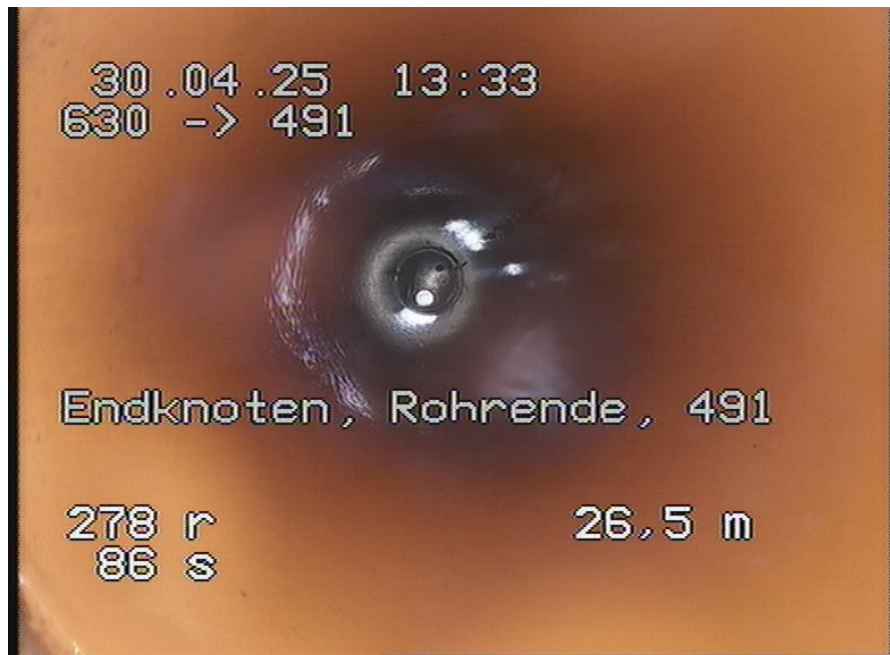

630-491_510.jpg, 00:02:47, 26.60m
Endknoten, Rohrende, 491
